

<平成26年度住宅除染対象地区と住宅除染の進捗状況>

計画件数

95,716 件

除染作業完了


(平成26年3月1日現在)

29,739 件

※住宅除染の詳細な進捗状況は、放射線対策ニュースをご覧ください。

平成26年度住宅除染実施地区(表①)

地区名	説明会時期(予定)	除染時期(予定)
東部 鎌田(東部支所管内)	3月24日	5月～
蓬萊 清水町	3月26日	
松川 松川町水原	3月27日	
信陵 大笹生、笹谷(飯坂街道西側)	4～5月	6月～
中央 太田町、須川町、三河南町、野田町(本庁管内)、東中央一丁目、南中央一・四丁目の一部(本庁管内)	5月	
杉妻 太平寺、黒岩、伏拝、鳥谷野	6月	7月～
清水 森合、泉、南沢又、野田町(清水支所管内)	7月	8月～
北信 鎌田(北信支所管内)、瀬上町、宮代、下飯坂、冲高	8月	9月～

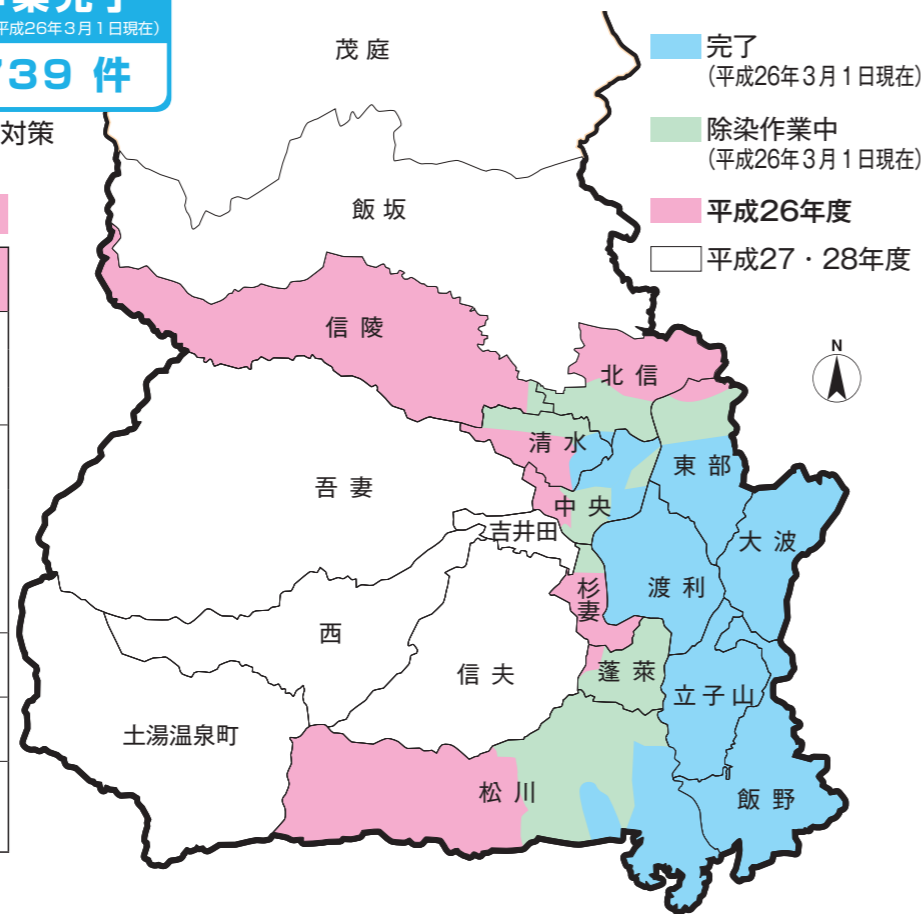

仮置場の設置状況(平成26年3月13日現在)

■設置済・設置決定済の仮置場(表②)

地区名	現在の作業状況	搬入開始の見通し
除去土壌搬入中	大波 造成完了	搬入完了(道路・住宅) 搬入中(生活圏森林)
	東部	搬入中(道路)
	松川	搬入中(道路・住宅)
	中央東	
	信陵	
搬入に向け準備中	渡利 進入路など造成工事中	平成26年秋
	飯野・立子山	平成27年秋
	蓬萊 測量設計作業中	
新規決定	中央西 地域除染等対策委員会了承(詳細設計中)	平成26年夏
	清水	平成26年秋
	立子山(2カ所目)	

■協議が進んでいる仮置場

測量設計後、地元と設置に向けた説明や協議を予定している地区
中央東(2カ所目)、飯坂、吾妻

11地区で仮置場の設置が決定

3月13日現在、新たに中央西、清水、立子山(2カ所目)を加えた計11地区で、仮置場の設置が決定しています。そのうち、大波地区では道路・住宅の除染が完了し、生活圏森林の除去土壌の搬入を開始しています。また、東部、松川、信陵、中央東地区では除去土壌の搬入を開始しており、渡利、飯野・立子山、蓬萊地区は搬入開始に向けて造成工事など準備を進めています(左表②参照)。

全ての仮置場では、通学路や道路側溝の除去土壌を優先して搬入しますが、容量が十分に確保されている大波、松川、中央

仮置場の設置を進め、現場保管の解消を目指す

今後も住宅や道路などの面的な除染を迅速に進めるとともに、使用開始される仮置場への除去土壌の搬入と、新たな仮置場の設置を進め、住宅内の現場保管の解消に全力で取り組んでいきます。

東地区は、通学路や道路側溝のほか住宅で現場保管されている除去土壌の搬入もすでに行われています。

仮置場の設置が決まっていな他の地区についても、地域除染等対策委員会と連携を図り、地区の皆さんのご理解とご協力をいただきながら、早期設置を目指し、最優先で進めます。

進めています 福島市の除染

平成26年度 除染を実施する地区をお知らせします

「ふるさと除染実施計画」に基づき、住宅や道路を含む面的な除染を進めています。このたび、平成26年度の住宅除染の実施地区が決定しましたのでお知らせします。

また、除染作業で出る除去土壌などを一時的に保管しておく仮置場の設置状況もお知らせします。

■問/除染推進室 ☎535-1136、515-5005、515-5006



▲住宅除染での表土剥ぎ取り

▼仮置場へ搬入された除去土壌

住宅除染の進捗状況


本市で進めている住宅の除染は、「ふるさと除染実施計画」の優先度に基づき、平成23年度から実施しています。

住宅除染の進捗状況は、平成26年3月1日現在で市内全域の除染計画件数95,716件中、29,739件の除染を完了し、進捗率は31パーセントです。

そのうち、大波、渡利、飯野、立子山地区の4地区で住宅除染が完了し、現在は、中央、東部、北信、信陵、清水、杉妻、蓬萊、松川の8地区で除染を実施しています(P3上図参照)。

平成26年度 除染実施地区

平成26年度に住宅除染を実施する地区は、平成25年度までに除染を開始した地区において、未実施エリアの全てが対象になります。具体的には、東部、蓬萊、松川、信陵、中央、杉妻、清水、北信地区の未実施エリアで除染を実施します(P3上図参照)。

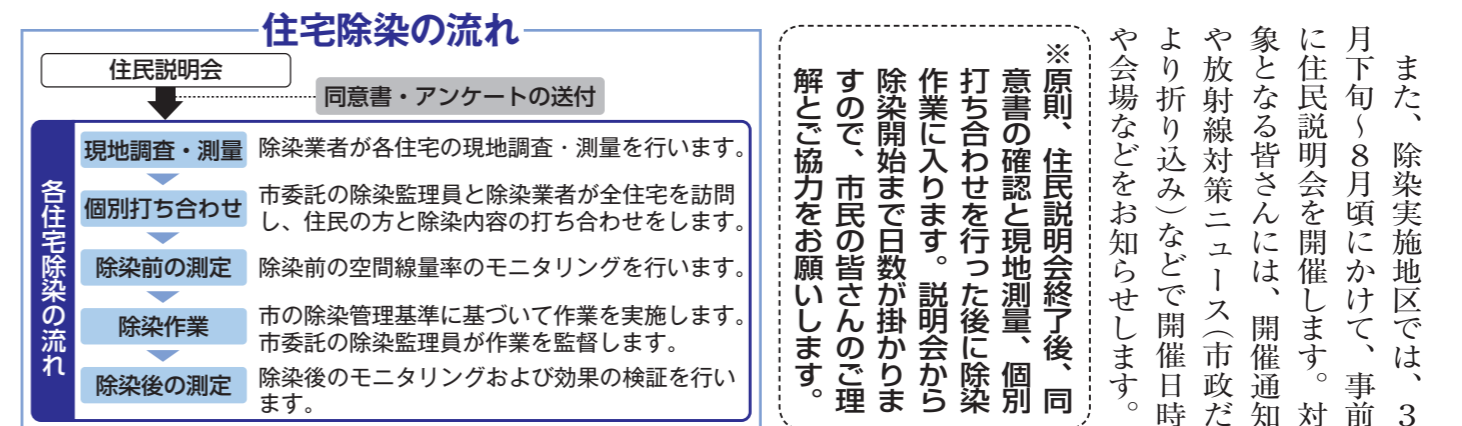

※説明会の前に、現地調査・測量などを実施する地区もあります。
