


設 計 書


委 託 名	令和6年度 福島市下水道ストックマネジメント点検調査計画策定業務委託(ポンプ場)		
委託箇所	福島市 堀河町 地内		
対象施設箇所 N= 1 箇所 (堀河第1ポンプ場)			
委託概要		委託仕様書	
「下水道ストックマネジメント実施に関するガイドライン」及び 「処理場・ポンプ場施設のストックマネジメント」に基づき、ポンプ場の 下水道ストックマネジメント計画策定業務を委託する。		別紙業務委託仕様書による。	

都市政策部長
下水道室長
課 長 検印
課長補佐 検印
審査者 検印
検算者 印
設計者 印

福島市下水道ストックマネジメント点検調査計画策定箇所図(ポンプ場)

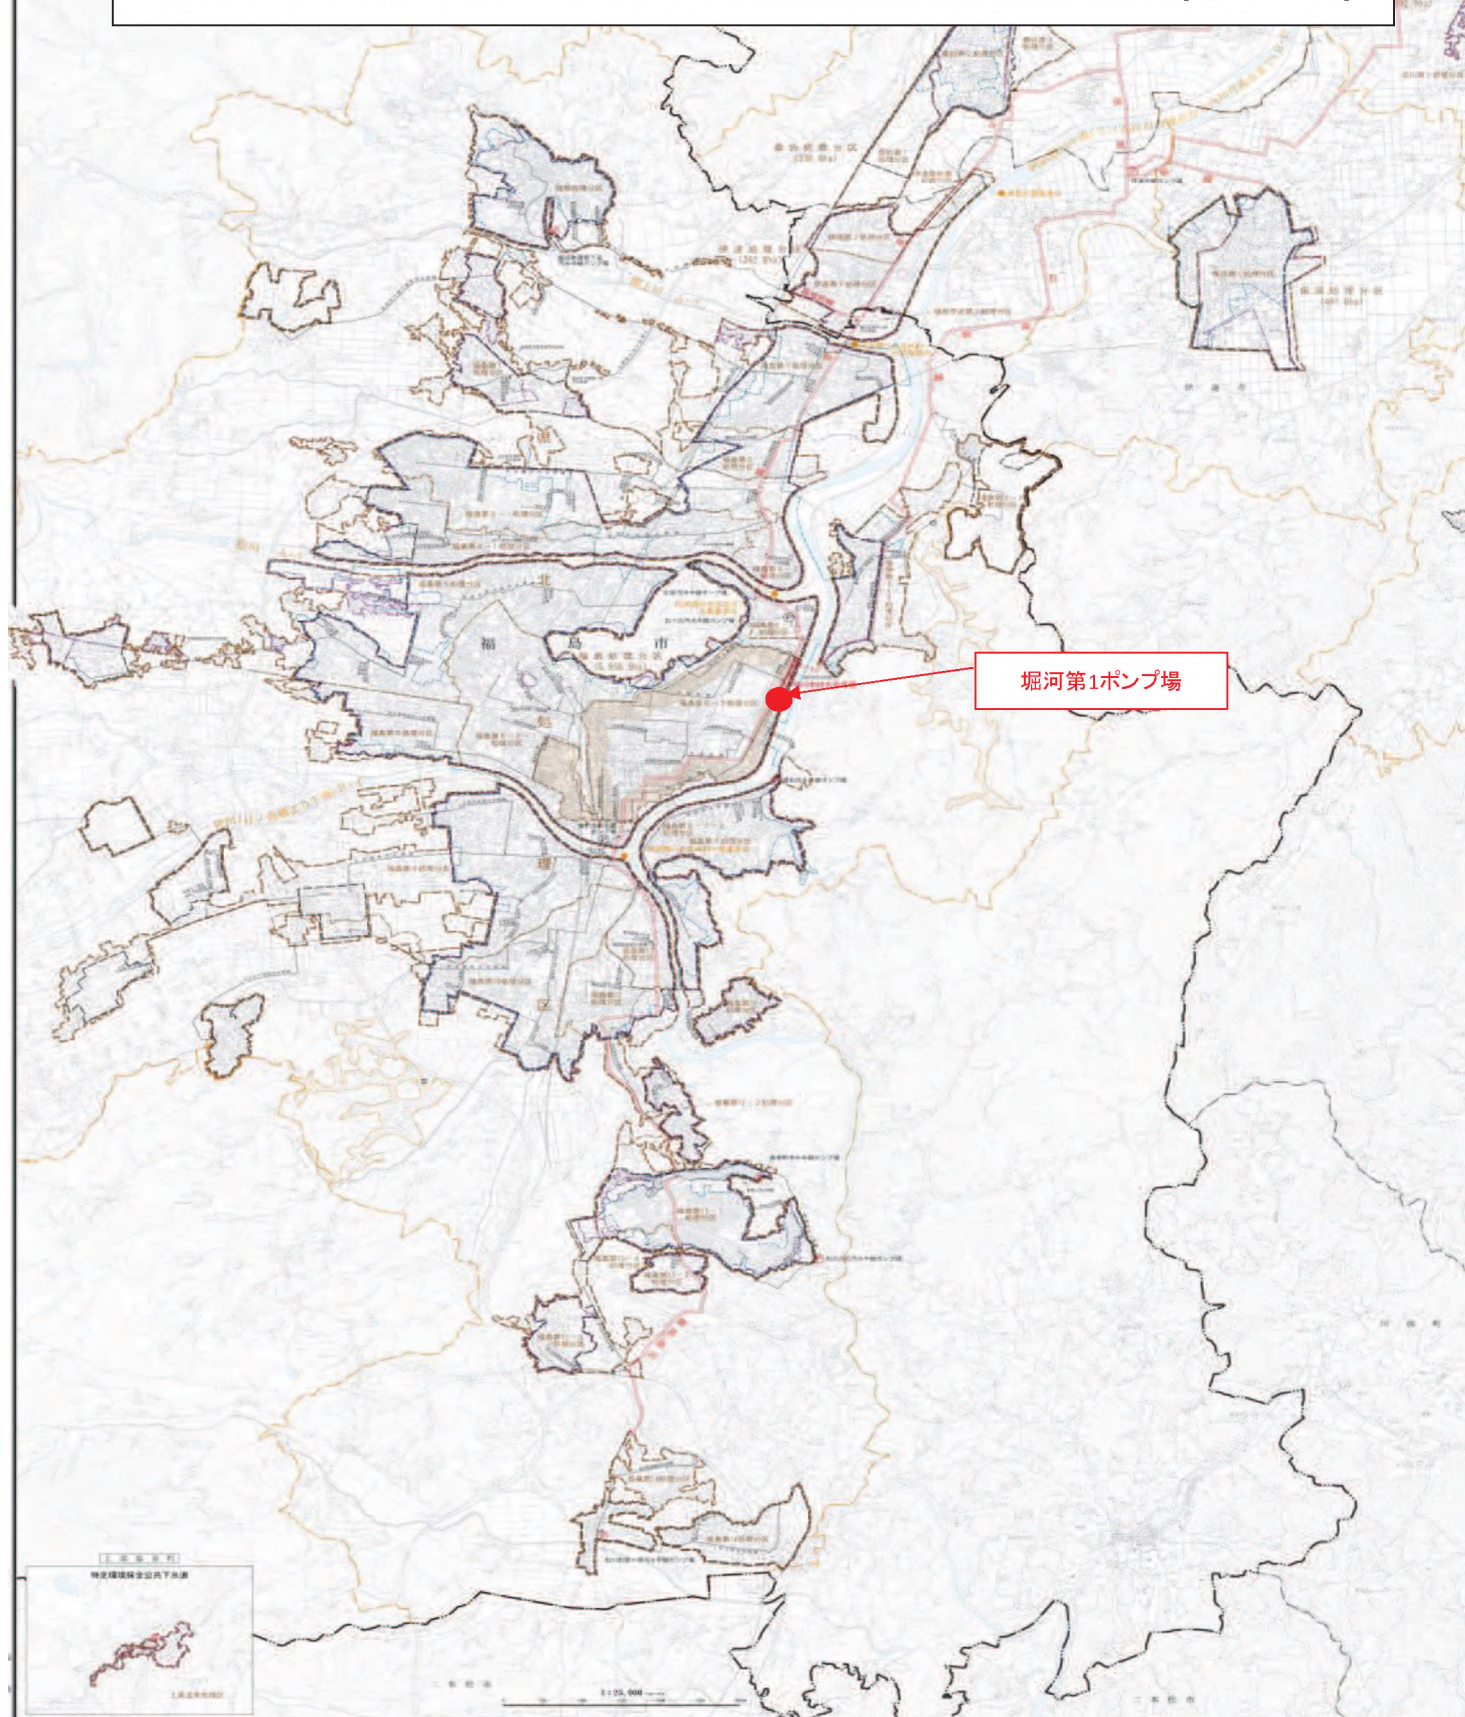

福島市下水道ストックマネジメント点検調査計画策定箇所図(ポンプ場)

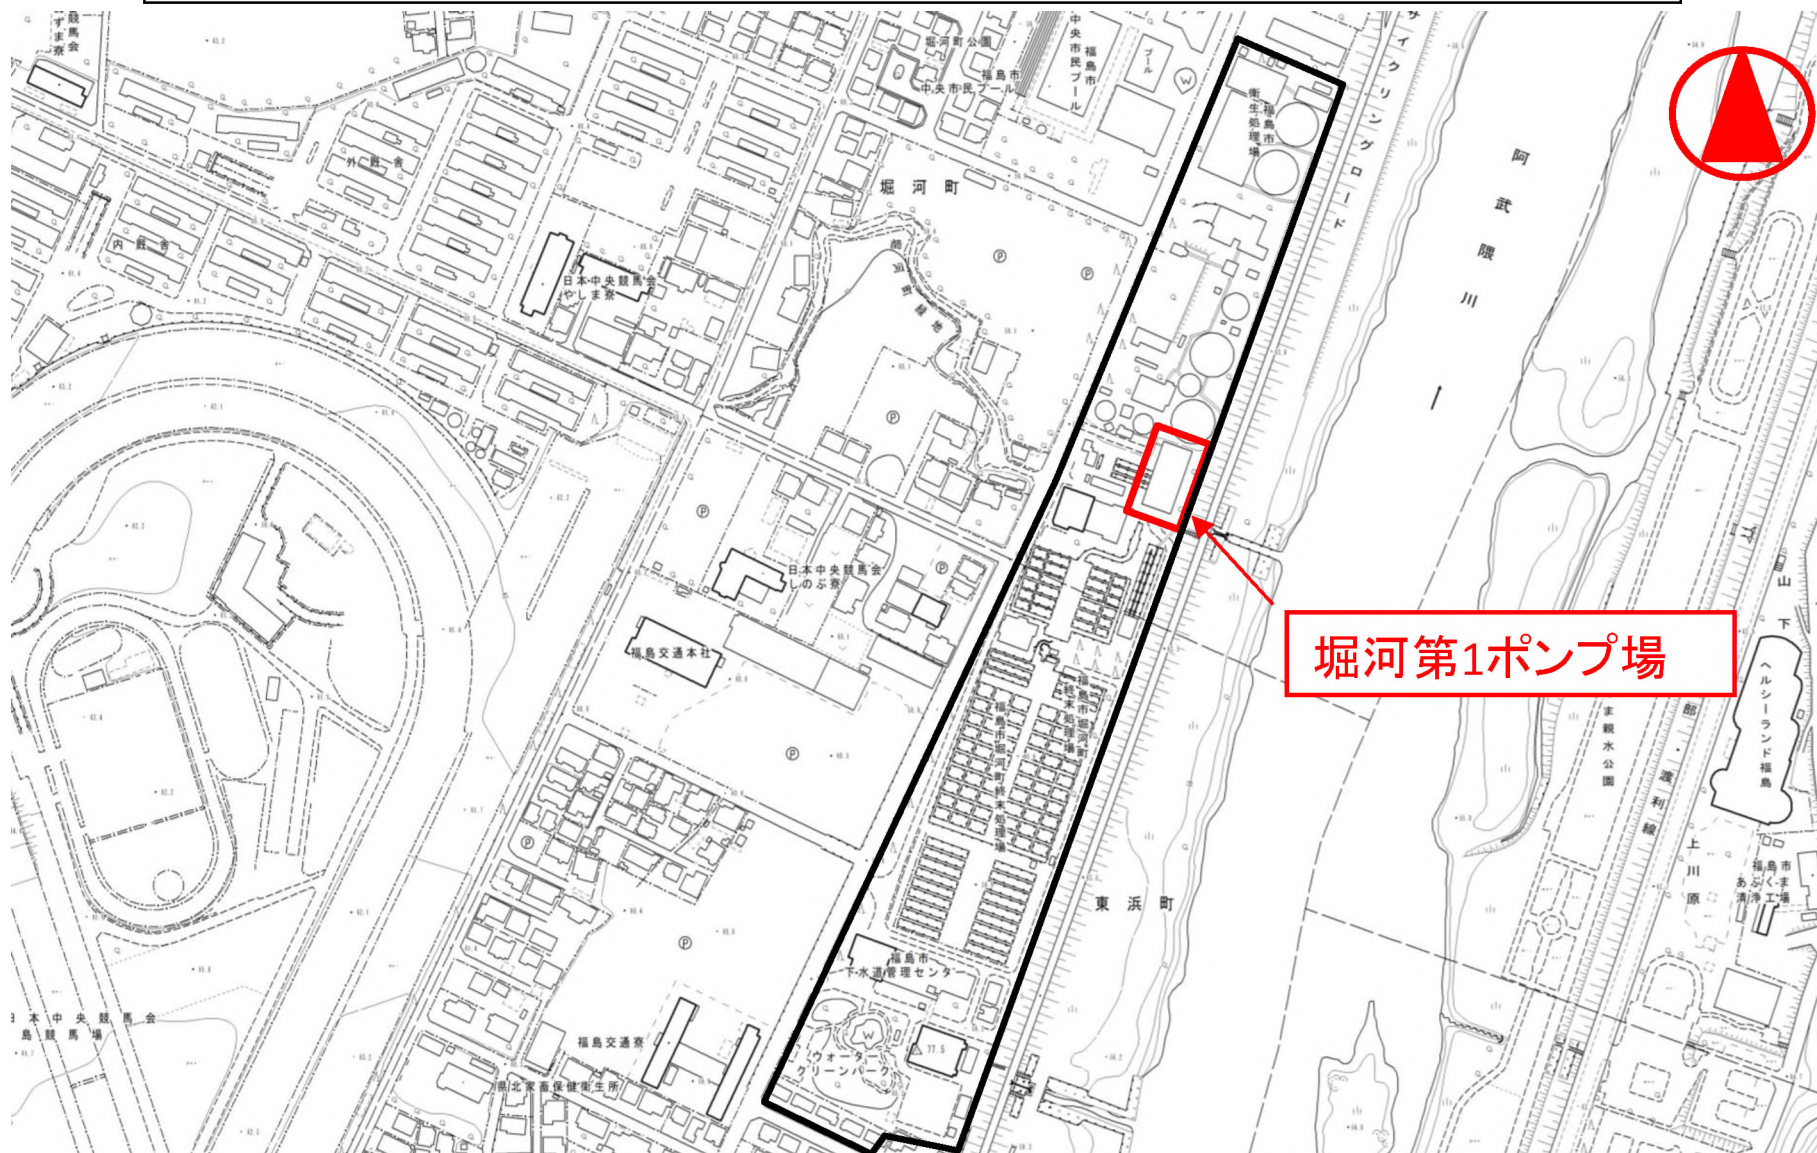

総 括 情 報 表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	00 市 町 村 業務委託設計書 当初 000000000000 0 1 実施単価 11 A (県北 1) 地区 00-06.07.20(0) 4 業務委託 000000000000当初下水道SM堀河第1ポンプ場点検調査計画策定業務委託		
	当 世 代		前 世 代
前払率 測量調査発注区分 冬期割増 設計発注区分 旅費交通費区分	30 00 建設コンサルタント 00 冬期割増なし 00 建設コンサルタント 02 率計上(X6:調査X8:用総)		

工種条件

条件	条件値	名称
A 水替費区分	0	水替費なし
	1	水替費あり
B 山林砂防工置き換え区分	0	山林砂防工置き換えなし
	1	山林砂防工置き換えあり
C 特殊勤務費[円]		

総 括 情 報 表

頁0-0002

	金 額			工事価格	消費税相当額	請負工事費
事業費			設計業務			
				22,820,000	2,282,000	25,102,000
工事費	25,102,000		業務委託費計			
				22,820,000	2,282,000	25,102,000
本工事費						
附帯工事費						
測量及び試験費						
	25,102,000					
用地及び補償費						
機械器具費						
営繕費						
工事雑費						
応急工事費						
事務費						
リザーブ						
リザーブ						
リザーブ						

測 量 及 び 試 験 費 内 訳 表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
設計業務					X6000
調査・計画業務費 直接原価（直接経費を除く直接原価）				(9,442,608) 9,442,608	Y1S46211100
ストックマネジメント点検調査計画策定業務				(9,442,608) 9,442,608	Y2S46211100
堀河第1ポンプ場点検調査計画 SM計画策定業務				(9,442,608) 9,442,608	Y3999
1. 施設情報の収集・整理				(1,966,780) 1,966,780	Y4999
1-1 施設情報の収集・整理	1	式	(607,152) 607,152	(607,152) 607,152	V0001 00 施工 第0 -0001号表
1-2 施設情報の作成	1	式	(607,230) 607,230	(607,230) 607,230	V00011 00 施工 第0 -0002号表
1-4 現地踏査	1	式	(752,398) 752,398	(752,398) 752,398	V0002 00 施工 第0 -0003号表
2. リスクの評価				(1,041,720) 1,041,720	Y4999
2-1 リスクの特定	1	式	(215,805) 215,805	(215,805) 215,805	V0003 00 施工 第0 -0004号表
2-2 被害規模の検討	1	式	(274,682) 274,682	(274,682) 274,682	V0004 00 施工 第0 -0005号表
2-3 発生確率の検討	1	式	(289,635) 289,635	(289,635) 289,635	V0005 00 施工 第0 -0006号表

測 量 及 び 試 験 費 内 訳 表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2-4 リスクの評価					V0006 00
	1	式	(261,598) 261,598	(261,598) 261,598	施工 第0 -0007号表
3. 施設管理の目標設定					Y4999
				(435,036) 435,036	
3-1 事業の目標設定					V0007 00
	1	式	(165,338) 165,338	(165,338) 165,338	施工 第0 -0008号表
3-2 事業量の目標設定					V0008 00
	1	式	(269,698) 269,698	(269,698) 269,698	施工 第0 -0009号表
4. 長期的な改築事業シナリオ設定					Y4999
				(1,360,093) 1,360,093	
4-1 管理方法の選定					V0009 00
	1	式	(210,197) 210,197	(210,197) 210,197	施工 第0 -0010号表
4-2 改築条件の設定					V0010 00
	1	式	(210,197) 210,197	(210,197) 210,197	施工 第0 -0011号表
4-3 最適なシナリオの選定					V0011 00
	1	式	(569,614) 569,614	(569,614) 569,614	施工 第0 -0012号表
4-4 長期的な改築事業シナリオのとりまとめ					V0012 00
	1	式	(370,085) 370,085	(370,085) 370,085	施工 第0 -0013号表
5. 点検・調査計画の策定					Y4999
				(1,101,061) 1,101,061	
5-1 頻度・項目の設定					V0013 00
	1	式	(134,420) 134,420	(134,420) 134,420	施工 第0 -0014号表
5-2 単位の設定					V0014 00
	1	式	(134,420) 134,420	(134,420) 134,420	施工 第0 -0015号表

測 量 及 び 試 験 費 内 訳 表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5-3 優先順位の設定					V0015 00
	1	式	(143,532) 143,532	(143,532) 143,532	施工 第0 -0016号表
5-4 対象施設・実施時期の検討					V0016 00
	1	式	(143,532) 143,532	(143,532) 143,532	施工 第0 -0017号表
5-5 点検・調査の方法の検討					V0017 00
	1	式	(121,336) 121,336	(121,336) 121,336	施工 第0 -0018号表
5-6 概算費用の算定					V0018 00
	1	式	(306,301) 306,301	(306,301) 306,301	施工 第0 -0019号表
5-7 点検・調査計画のまとめ					V0019 00
	1	式	(117,520) 117,520	(117,520) 117,520	施工 第0 -0020号表
9. 照査					Y4999
				(183,018) 183,018	
9 照査					V0020 00
	1	式	(183,018) 183,018	(183,018) 183,018	施工 第0 -0021号表
10. 報告書作成					Y4999
				(1,161,300) 1,161,300	
10 報告書作成					V0021 00
	1	式	(1,161,300) 1,161,300	(1,161,300) 1,161,300	施工 第0 -0022号表
11. 設計協議					Y4999
				(2,193,600) 2,193,600	
11 設計協議 中間打合せ2回					V0022 00
	1	式	(2,193,600) 2,193,600	(2,193,600) 2,193,600	施工 第0 -0023号表
旅費交通費					Z0011
		式		140,694	

測 量 及 び 試 験 費 内 訳 表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	140694=9442608*0.0149 円止め 対象額…… 9,442,608 率…………… 0.0149				140,694	
電子成果物作成費(D)						Z0014
			式		165,000	
電子成果物作成費(その他の設計業務) 直接人件費入力(中間技術審査を除く)						SC905 00
		1	式	165,000	165,000	施工 第0 -0024号表
直接経費計						
					305,694	
直接原価						
					(9,442,608) 9,748,302	
その他原価	5084844=9442608*0.350/(1-0.350)=9442608*0.5385 対象額…… 9,442,608 率…………… 0.5385					
			式		5,084,844	
業務原価						
					14,833,146	
一般管理費等	7987649=14833146*0.350/(1-0.350)=14833146*0.5385 対象額…… 14,833,146 率…………… 0.5385					
			式		7,987,649	
業務価格						
					22,820,795	
業務委託料 (まるめ)						
					22,820,000	
業務価格計						
					22,820,000	
消費税等相当額計	2282000=22820000*0.10 対象額…… 22,820,000 率…………… 0.1000					
			式		2,282,000	

測 量 及 び 試 験 費 内 訳 表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
委託費計						
					25,102,000	

施 工 内 訳 表

頁0-0008

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-1 施設情報の収集・整理 V0001	1	式			施工 第0 -0001号表 特単単価適用日：06年07月20日
理事・技師長（内業） [55%]	0.5	人	(75,800) 75,800	(37,900) 37,900	R5420
主任技師（内業） [55%]	1.0	人	(64,800) 64,800	(64,800) 64,800	R5430
技師（A）（内業） [55%]	2.5	人	(57,000) 57,000	(142,500) 142,500	R5440
技師（B）（内業） [55%]	4.0	人	(47,200) 47,200	(188,800) 188,800	R5450
技師（C）（内業） [55%]	5.5	人	(38,400) 38,400	(211,200) 211,200	R5460
技術員（内業） [55%]	4.0	人	(33,600) 33,600	(134,400) 134,400	R5470
設計対象水量補正		式	(779,600) 779,600	(1,103,913) 1,103,913	+00 779600*1.416
作業比率補正		式	(1,103,913) 1,103,913	(607,152) 607,152	+00 1103913*0.55
*** 単位当たり ***	1	式		(607,152) 607,152	

00000000000

福 島 市

施 工 内 訳 表

頁0-0009

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-2 施設情報の作成 V00011	1	式			施工 第0 -0002号表 特単単価適用日：06年07月20日
主任技師 (内業) [55%]	1.0	人	(64,800) (64,800) 64,800		R5430
技師 (A) (内業) [55%]	2.5	人	(57,000) (142,500) 57,000 142,500		R5440
技師 (B) (内業) [55%]	4.5	人	(47,200) (212,400) 47,200 212,400		R5450
技師 (C) (内業) [55%]	5.0	人	(38,400) (192,000) 38,400 192,000		R5460
技術員 (内業) [55%]	5.0	人	(33,600) (168,000) 33,600 168,000		R5470
設計対象水量補正		式	(779,700) (1,104,055) 779,700 1,104,055		+00 779700*1.416
作業比率補正		式	(1,104,055) (607,230) 1,104,055 607,230		+00 1104055*0.55
*** 単位当たり ***	1	式		(607,230) 607,230	

00000000000

福 島 市

施 工 内 訳 表

頁0-0010

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-4 現地踏査 V0002	1	式			施工 第0 -0003号表 特単単価適用日：06年07月20日
主任技師 (内業) [55%]	3.0	人	(64,800) (64,800)	(194,400) (194,400)	R5430
技師 (A) (内業) [55%]	6.5	人	(57,000) (57,000)	(370,500) (370,500)	R5440
技師 (B) (内業) [55%]	8.5	人	(47,200) (47,200)	(401,200) (401,200)	R5450
設計対象水量補正		式	(966,100) (966,100)	(1,367,997) (1,367,997)	+00 966100*1.416
作業比率補正		式	(1,367,997) (1,367,997)	(752,398) (752,398)	+00 1367997*0.55
*** 単位当たり ***	1	式		(752,398) (752,398)	

00000000000

福 島 市

施 工 内 訳 表

頁0-0011

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2-1 リスクの特定 V0003	1	式			施工 第0 -0004号表 特単単価適用日：06年07月20日
主任技師 (内業) [55%]	1.5	人	(64,800) (64,800)	(97,200) (97,200)	R5430
技師 (A) (内業) [55%]	1.5	人	(57,000) (57,000)	(85,500) (85,500)	R5440
技師 (B) (内業) [55%]	2.0	人	(47,200) (47,200)	(94,400) (94,400)	R5450
設計対象水量補正		式	(277,100) (277,100)	(392,373) (392,373)	+00 277100*1.416
作業比率補正		式	(392,373) (392,373)	(215,805) (215,805)	+00 392373*0.55
*** 単位当たり ***	1	式		(215,805) (215,805)	

00000000000

福 島 市

施 工 内 訳 表

頁0-0012

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2-2 被害規模の検討 V0004	1	式			施工 第0 -0005号表 特単単価適用日：06年07月20日
主任技師 (内業) [55%]	1.0	人	(64,800) (64,800) 64,800	(64,800) 64,800	R5430
技師 (A) (内業) [55%]	1.5	人	(57,000) (57,000) 57,000	(85,500) 85,500	R5440
技師 (B) (内業) [55%]	2.0	人	(47,200) (47,200) 47,200	(94,400) 94,400	R5450
技師 (C) (内業) [55%]	1.5	人	(38,400) (38,400) 38,400	(57,600) 57,600	R5460
技術員 (内業) [55%]	1.5	人	(33,600) (33,600) 33,600	(50,400) 50,400	R5470
設計対象水量補正		式	(352,700) (352,700) 352,700	(499,423) 499,423	+00 352700*1.416
作業比率補正		式	(499,423) (499,423) 499,423	(274,682) 274,682	+00 499423*0.55
*** 単位当たり ***	1	式		(274,682) 274,682	

00000000000

福 島 市

施 工 内 訳 表

頁0-0013

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2-3 発生確率の検討 V0005	1	式			施工 第0 -0006号表 特単単価適用日：06年07月20日
主任技師 (内業) [55%]	1.0	人	(64,800) (64,800) 64,800		R5430
技師 (A) (内業) [55%]	1.5	人	(57,000) (85,500) 57,000		R5440
技師 (B) (内業) [55%]	2.0	人	(47,200) (94,400) 47,200		R5450
技師 (C) (内業) [55%]	2.0	人	(38,400) (76,800) 38,400		R5460
技術員 (内業) [55%]	1.5	人	(33,600) (50,400) 33,600		R5470
設計対象水量補正		式	(371,900) (526,610) 371,900		+00 371900*1.416
作業比率補正		式	(526,610) (289,635) 526,610		+00 526610*0.55
*** 単位当たり ***	1	式		(289,635) 289,635	

00000000000

福 島 市

施 工 内 訳 表

頁0-0014

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2-4 リスクの評価 V0006	1	式			施工 第0 -0007号表 特単単価適用日：06年07月20日
主任技師 (内業) [55%]	1.0	人	(64,800) (64,800)		R5430
技師 (A) (内業) [55%]	1.5	人	(57,000) (57,000)	(85,500) (85,500)	R5440
技師 (B) (内業) [55%]	2.0	人	(47,200) (47,200)	(94,400) (94,400)	R5450
技師 (C) (内業) [55%]	1.5	人	(38,400) (38,400)	(57,600) (57,600)	R5460
技術員 (内業) [55%]	1.0	人	(33,600) (33,600)	(33,600) (33,600)	R5470
設計対象水量補正		式	(335,900) (335,900)	(475,634) (475,634)	+00 335900*1.416
作業比率補正		式	(475,634) (475,634)	(261,598) (261,598)	+00 475634*0.55
*** 単位当たり ***	1	式		(261,598) (261,598)	

00000000000

福 島 市

施 工 内 訳 表

頁0-0015

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-1 事業の目標設定 V0007	1	式			施工 第0 -0008号表 特単単価適用日：06年07月20日
主任技師 (内業) [55%]	0.5	人	(64,800) (64,800)	(32,400) (32,400)	R5430
技師 (A) (内業) [55%]	1.5	人	(57,000) (57,000)	(85,500) (85,500)	R5440
技師 (B) (内業) [55%]	2.0	人	(47,200) (47,200)	(94,400) (94,400)	R5450
設計対象水量補正		式	(212,300) (212,300)	(300,616) (300,616)	+00 212300*1.416
作業比率補正		式	(300,616) (300,616)	(165,338) (165,338)	+00 300616*0.55
*** 単位当たり ***	1	式		(165,338) (165,338)	

00000000000

福 島 市

施 工 内 訳 表

頁0-0016

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-2 事業量の目標設定 V0008	1	式			施工 第0 -0009号表 特単単価適用日：06年07月20日
主任技師 (内業) [55%]	0.5	人	(64,800) 64,800	(32,400) 32,400	R5430
技師 (A) (内業) [55%]	1.5	人	(57,000) 57,000	(85,500) 85,500	R5440
技師 (B) (内業) [55%]	2.5	人	(47,200) 47,200	(118,000) 118,000	R5450
技師 (C) (内業) [55%]	2.0	人	(38,400) 38,400	(76,800) 76,800	R5460
技術員 (内業) [55%]	1.0	人	(33,600) 33,600	(33,600) 33,600	R5470
設計対象水量補正		式	(346,300) 346,300	(490,360) 490,360	+00 346300*1.416
作業比率補正		式	(490,360) 490,360	(269,698) 269,698	+00 490360*0.55
*** 単位当たり ***	1	式		(269,698) 269,698	

00000000000

福 島 市

施 工 内 訳 表

頁0-0017

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4-1 管理方法の選定 V0009	1	式			施工 第0 -0010号表 特単単価適用日：06年07月20日
主任技師 (内業) [55%]	0.5	人	(64,800) (64,800)	(32,400) (32,400)	R5430
技師 (A) (内業) [55%]	1.5	人	(57,000) (57,000)	(85,500) (85,500)	R5440
技師 (B) (内業) [55%]	2.0	人	(47,200) (47,200)	(94,400) (94,400)	R5450
技師 (C) (内業) [55%]	1.5	人	(38,400) (38,400)	(57,600) (57,600)	R5460
設計対象水量補正		式	(269,900) (269,900)	(382,178) (382,178)	+00 269900*1.416
作業比率補正		式	(382,178) (382,178)	(210,197) (210,197)	+00 382178*0.55
*** 単位当たり ***	1	式		(210,197) (210,197)	

00000000000

福 島 市

施 工 内 訳 表

頁0-0018

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4-2 改築条件の設定 V0010	1	式			施工 第0 -0011号表 特単単価適用日：06年07月20日
主任技師 (内業) [55%]	0.5	人	(64,800) (64,800)	(32,400) (32,400)	R5430
技師 (A) (内業) [55%]	1.5	人	(57,000) (57,000)	(85,500) (85,500)	R5440
技師 (B) (内業) [55%]	2.0	人	(47,200) (47,200)	(94,400) (94,400)	R5450
技師 (C) (内業) [55%]	1.5	人	(38,400) (38,400)	(57,600) (57,600)	R5460
設計対象水量補正		式	(269,900) (269,900)	(382,178) (382,178)	+00 269900*1.416
作業比率補正		式	(382,178) (382,178)	(210,197) (210,197)	+00 382178*0.55
*** 単位当たり ***	1	式		(210,197) (210,197)	

00000000000

福 島 市

施 工 内 訳 表

頁0-0019

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4-3 最適なシナリオの選定 V0011	1	式			施工 第0 -0012号表 特単単価適用日：06年07月20日
主任技師 (内業) [55%]	2.5	人	(64,800) (64,800)	(162,000) (162,000)	R5430
技師 (A) (内業) [55%]	3.0	人	(57,000) (57,000)	(171,000) (171,000)	R5440
技師 (B) (内業) [55%]	6.0	人	(47,200) (47,200)	(283,200) (283,200)	R5450
技師 (C) (内業) [55%]	3.0	人	(38,400) (38,400)	(115,200) (115,200)	R5460
設計対象水量補正		式	(731,400) (731,400)	(1,035,662) (1,035,662)	+00 731400*1.416
作業比率補正		式	(1,035,662) (1,035,662)	(569,614) (569,614)	+00 1035662*0.55
*** 単位当たり ***	1	式		(569,614) (569,614)	

00000000000

福 島 市

施 工 内 訳 表

頁0-0020

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4-4 長期的な改築事業シナリオのとりまとめ V0012	1	式			施工 第0 -0013号表 特単単価適用日：06年07月20日
理事・技師長（内業） [55%]	0.5	人	(75,800) 75,800	(37,900) 37,900	R5420
主任技師（内業） [55%]	2.0	人	(64,800) 64,800	(129,600) 129,600	R5430
技師（A）（内業） [55%]	2.5	人	(57,000) 57,000	(142,500) 142,500	R5440
技師（B）（内業） [55%]	3.5	人	(47,200) 47,200	(165,200) 165,200	R5450
設計対象水量補正		式	(475,200) 475,200	(672,883) 672,883	+00 475200*1.416
作業比率補正		式	(672,883) 672,883	(370,085) 370,085	+00 672883*0.55
*** 単位当たり ***	1	式		(370,085) 370,085	

00000000000

福 島 市

施 工 内 訳 表

頁0-0021

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5-1 頻度・項目の設定 V0013	1	式			施工 第0 -0014号表 特単単価適用日：06年07月20日
主任技師 (内業) [55%]	0.5	人	(64,800) (64,800)	(32,400) (32,400)	R5430
技師 (A) (内業) [55%]	1.0	人	(57,000) (57,000)	(57,000) (57,000)	R5440
技師 (B) (内業) [55%]	1.0	人	(47,200) (47,200)	(47,200) (47,200)	R5450
技師 (C) (内業) [55%]	0.5	人	(38,400) (38,400)	(19,200) (19,200)	R5460
技術員 (内業) [55%]	0.5	人	(33,600) (33,600)	(16,800) (16,800)	R5470
設計対象水量補正		式	(172,600) (172,600)	(244,401) (244,401)	+00 172600*1.416
作業比率補正		式	(244,401) (244,401)	(134,420) (134,420)	+00 244401*0.55
*** 単位当たり ***	1	式		(134,420) (134,420)	

00000000000

福 島 市

施 工 内 訳 表

頁0-0022

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5-2 単位の設定 V0014	1	式			施工 第0 -0015号表 特単単価適用日：06年07月20日
主任技師 (内業) [55%]	0.5	人	(64,800) (64,800)	(32,400) (32,400)	R5430
技師 (A) (内業) [55%]	1.0	人	(57,000) (57,000)	(57,000) (57,000)	R5440
技師 (B) (内業) [55%]	1.0	人	(47,200) (47,200)	(47,200) (47,200)	R5450
技師 (C) (内業) [55%]	0.5	人	(38,400) (38,400)	(19,200) (19,200)	R5460
技術員 (内業) [55%]	0.5	人	(33,600) (33,600)	(16,800) (16,800)	R5470
設計対象水量補正		式	(172,600) (172,600)	(244,401) (244,401)	+00 172600*1.416
作業比率補正		式	(244,401) (244,401)	(134,420) (134,420)	+00 244401*0.55
*** 単位当たり ***	1	式		(134,420) (134,420)	

00000000000

福 島 市

施 工 内 訳 表

頁0-0023

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5-3 優先順位の設定 V0015	1	式			施工 第0 -0016号表 特単単価適用日：06年07月20日
主任技師 (内業) [55%]	0.5	人	(64,800) (64,800)	(32,400) (32,400)	R5430
技師 (A) (内業) [55%]	1.5	人	(57,000) (57,000)	(85,500) (85,500)	R5440
技師 (B) (内業) [55%]	1.0	人	(47,200) (47,200)	(47,200) (47,200)	R5450
技師 (C) (内業) [55%]	0.5	人	(38,400) (38,400)	(19,200) (19,200)	R5460
設計対象水量補正		式	(184,300) (184,300)	(260,968) (260,968)	+00 184300*1.416
作業比率補正		式	(260,968) (260,968)	(143,532) (143,532)	+00 260968*0.55
*** 単位当たり ***	1	式		(143,532) (143,532)	

00000000000

福 島 市

施 工 内 訳 表

頁0-0024

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5-4 対象施設・実施時期の検討 V0016	1	式			施工 第0 -0017号表 特単単価適用日：06年07月20日
主任技師 (内業) [55%]	0.5	人	(64,800) (64,800)	(32,400) (32,400)	R5430
技師 (A) (内業) [55%]	1.5	人	(57,000) (57,000)	(85,500) (85,500)	R5440
技師 (B) (内業) [55%]	1.0	人	(47,200) (47,200)	(47,200) (47,200)	R5450
技師 (C) (内業) [55%]	0.5	人	(38,400) (38,400)	(19,200) (19,200)	R5460
設計対象水量補正		式	(184,300) (184,300)	(260,968) (260,968)	+00 184300*1.416
作業比率補正		式	(260,968) (260,968)	(143,532) (143,532)	+00 260968*0.55
*** 単位当たり ***	1	式		(143,532) (143,532)	

00000000000

福 島 市

施 工 内 訳 表

頁0-0025

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5-5 点検・調査の方法の検討 V0017	1	式			施工 第0 -0018号表 特単単価適用日：06年07月20日
主任技師 (内業) [55%]	0.5	人	(64,800) (64,800)	(32,400) (32,400)	R5430
技師 (A) (内業) [55%]	1.0	人	(57,000) (57,000)	(57,000) (57,000)	R5440
技師 (B) (内業) [55%]	1.0	人	(47,200) (47,200)	(47,200) (47,200)	R5450
技師 (C) (内業) [55%]	0.5	人	(38,400) (38,400)	(19,200) (19,200)	R5460
設計対象水量補正		式	(155,800) (155,800)	(220,612) (220,612)	+00 155800*1.416
作業比率補正		式	(220,612) (220,612)	(121,336) (121,336)	+00 220612*0.55
*** 単位当たり ***	1	式		(121,336) (121,336)	

00000000000

福 島 市

施 工 内 訳 表

頁0-0026

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5-6 概算費用の算定 V0018	1	式			施工 第0 -0019号表 特単単価適用日：06年07月20日
主任技師 (内業) [55%]	0.5	人	(64,800) (64,800)	(32,400) (32,400)	R5430
技師 (A) (内業) [55%]	2.5	人	(57,000) (57,000)	(142,500) (142,500)	R5440
技師 (B) (内業) [55%]	3.0	人	(47,200) (47,200)	(141,600) (141,600)	R5450
技師 (C) (内業) [55%]	2.0	人	(38,400) (38,400)	(76,800) (76,800)	R5460
設計対象水量補正		式	(393,300) (393,300)	(556,912) (556,912)	+00 393300*1.416
作業比率補正		式	(556,912) (556,912)	(306,301) (306,301)	+00 556912*0.55
*** 単位当たり ***	1	式		(306,301) (306,301)	

00000000000

福 島 市

施 工 内 訳 表

頁0-0027

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5-7 点検・調査計画のまとめ V0019	1	式			施工 第0 -0020号表 特単単価適用日：06年07月20日
理事・技師長（内業） [55%]	0.5	人	(75,800) 75,800	(37,900) 37,900	R5420
主任技師（内業） [55%]	0.5	人	(64,800) 64,800	(32,400) 32,400	R5430
技師（A）（内業） [55%]	1.0	人	(57,000) 57,000	(57,000) 57,000	R5440
技師（B）（内業） [55%]	0.5	人	(47,200) 47,200	(23,600) 23,600	R5450
設計対象水量補正		式	(150,900) 150,900	(213,674) 213,674	+00 150900*1.416
作業比率補正		式	(213,674) 213,674	(117,520) 117,520	+00 213674*0.55
*** 単位当たり ***	1	式		(117,520) 117,520	

00000000000

福 島 市

施 工 内 訳 表

頁0-0028

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9 照査 V0020	1	式			施工 第0 -0021号表 特単単価適用日：06年07月20日
理事・技師長（内業） [55%]	1.0	人	(75,800) 75,800	(75,800) 75,800	R5420
主任技師（内業） [55%]	1.5	人	(64,800) 64,800	(97,200) 97,200	R5430
技師（A）（内業） [55%]	1.5	人	(57,000) 57,000	(85,500) 85,500	R5440
設計対象水量補正		式	(258,500) 258,500	(366,036) 366,036	+00 258500*1.416
業務分割による補正		式	(366,036) 366,036	(183,018) 183,018	+00 366036*0.5
*** 単位当たり ***	1	式		(183,018) 183,018	

00000000000

福 島 市

施 工 内 訳 表

頁0-0029

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1 0 報告書作成 V0021	1	式			施工 第0 -0022号表 特単単価適用日：06年07月20日
主任技師 (内業) [55%]	4.5	人	(64,800) 64,800	(291,600) 291,600	R5430
技師 (A) (内業) [55%]	8.5	人	(57,000) 57,000	(484,500) 484,500	R5440
技師 (B) (内業) [55%]	4.5	人	(47,200) 47,200	(212,400) 212,400	R5450
技師 (C) (内業) [55%]	4.5	人	(38,400) 38,400	(172,800) 172,800	R5460
*** 単位当たり ***	1	式		(1,161,300) 1,161,300	
*****					*****
1 1 設計協議 V0022 中間打合せ2回	1	式			施工 第0 -0023号表 特単単価適用日：06年07月20日
主任技師 (内業) [55%]	4.0	人	(64,800) 64,800	(259,200) 259,200	R5430
技師 (A) (内業) [55%]	24.0	人	(57,000) 57,000	(1,368,000) 1,368,000	R5440
技師 (B) (内業) [55%]	12.0	人	(47,200) 47,200	(566,400) 566,400	R5450
*** 単位当たり ***	1	式		(2,193,600) 2,193,600	

00000000000

福 島 市

